Site				Gosport		Date				14.08.18	
Contract				6056		Test n°		1		AREA	-
Operator				P McQueen		Column n°		Test 2		Chainage	-
JACK'S PRESSION (bars)	LOAD (T)	TIME (mn)	SENSOR READING (mm)	OBSERVATIONS Jack : RC756	DEFLEXION (mm)	JACK'S PRESSION (bars)	LOAD (T)	TIME (mn)	SENSOR READING (mm)	OBSERVATIONS Jack : RC756	DEFLEXION (mm)
41	4.2	1	8.30	20%	0.00	164	16.8	1	9.26	80%	-1.92
		5	8.31		-0.02			2	9.26		-1.92
								3	9.27		-1.94
0	0.0	1	8.30	0%	0.00			4	9.27		-1.94
		5	8.30		0.00			5	9.28		-1.96
								10	9.28		-1.96
41	4.2	1	8.40	20%	-0.20			15	9.28		-1.96
		2	8.40		-0.20						
		3	8.40		-0.20						
		4	8.40		-0.20						
		5	8.40		-0.20						
		10	8.40		-0.20	205	21.0	1	9.67	100%	-2.74
		15	8.40		-0.20			2	9.69		-2.78
								3	9.70		-2.80
								4	9.71		-2.82
82	8.4	1	8.65	40%	-0.70			5	9.71		-2.82
		2	8.65		-0.70			10	9.72		-2.84
		3	8.65		-0.70			15	9.73		-2.86
		4	8.65		-0.70			30	9.75		-2.90
		5	8.65		-0.70			60	9.76		-2.92
		10	8.65		-0.70						
		15	8.65		-0.70						
						102	10.5	1	9.70	50%	-2.80
								5	9.69		-2.78
123	12.6	1	8.85	60%	-1.10						
		2	8.87		-1.14	0	0	1	9.28	0%	-1.96
		3	8.88		-1.16			5	9.25		-1.90
		4	8.90		-1.20						
		5	8.91		-1.22						
		10	8.91		-1.22						
		15	8.91		-1.22						

COMMENTS :

PERSONS PRESENT DURING THE TEST :

If the compaction does not exceed 0,02 mm / min Go to the next stage !

VIBRO MENARD

DOCUMENT				REF : XG	PAGE : 1 / 1
Load test CMC				DOC 03-022	INDICE : A
WRITTEN THE :	14/08/18	PAR :	PM	VALIDATION VISA	
MODIFIED THE :	31/08/18	PAR :	MW		
VALIDATED THE :	31/08/18	PAR :	MW		

Curve Load / settlement

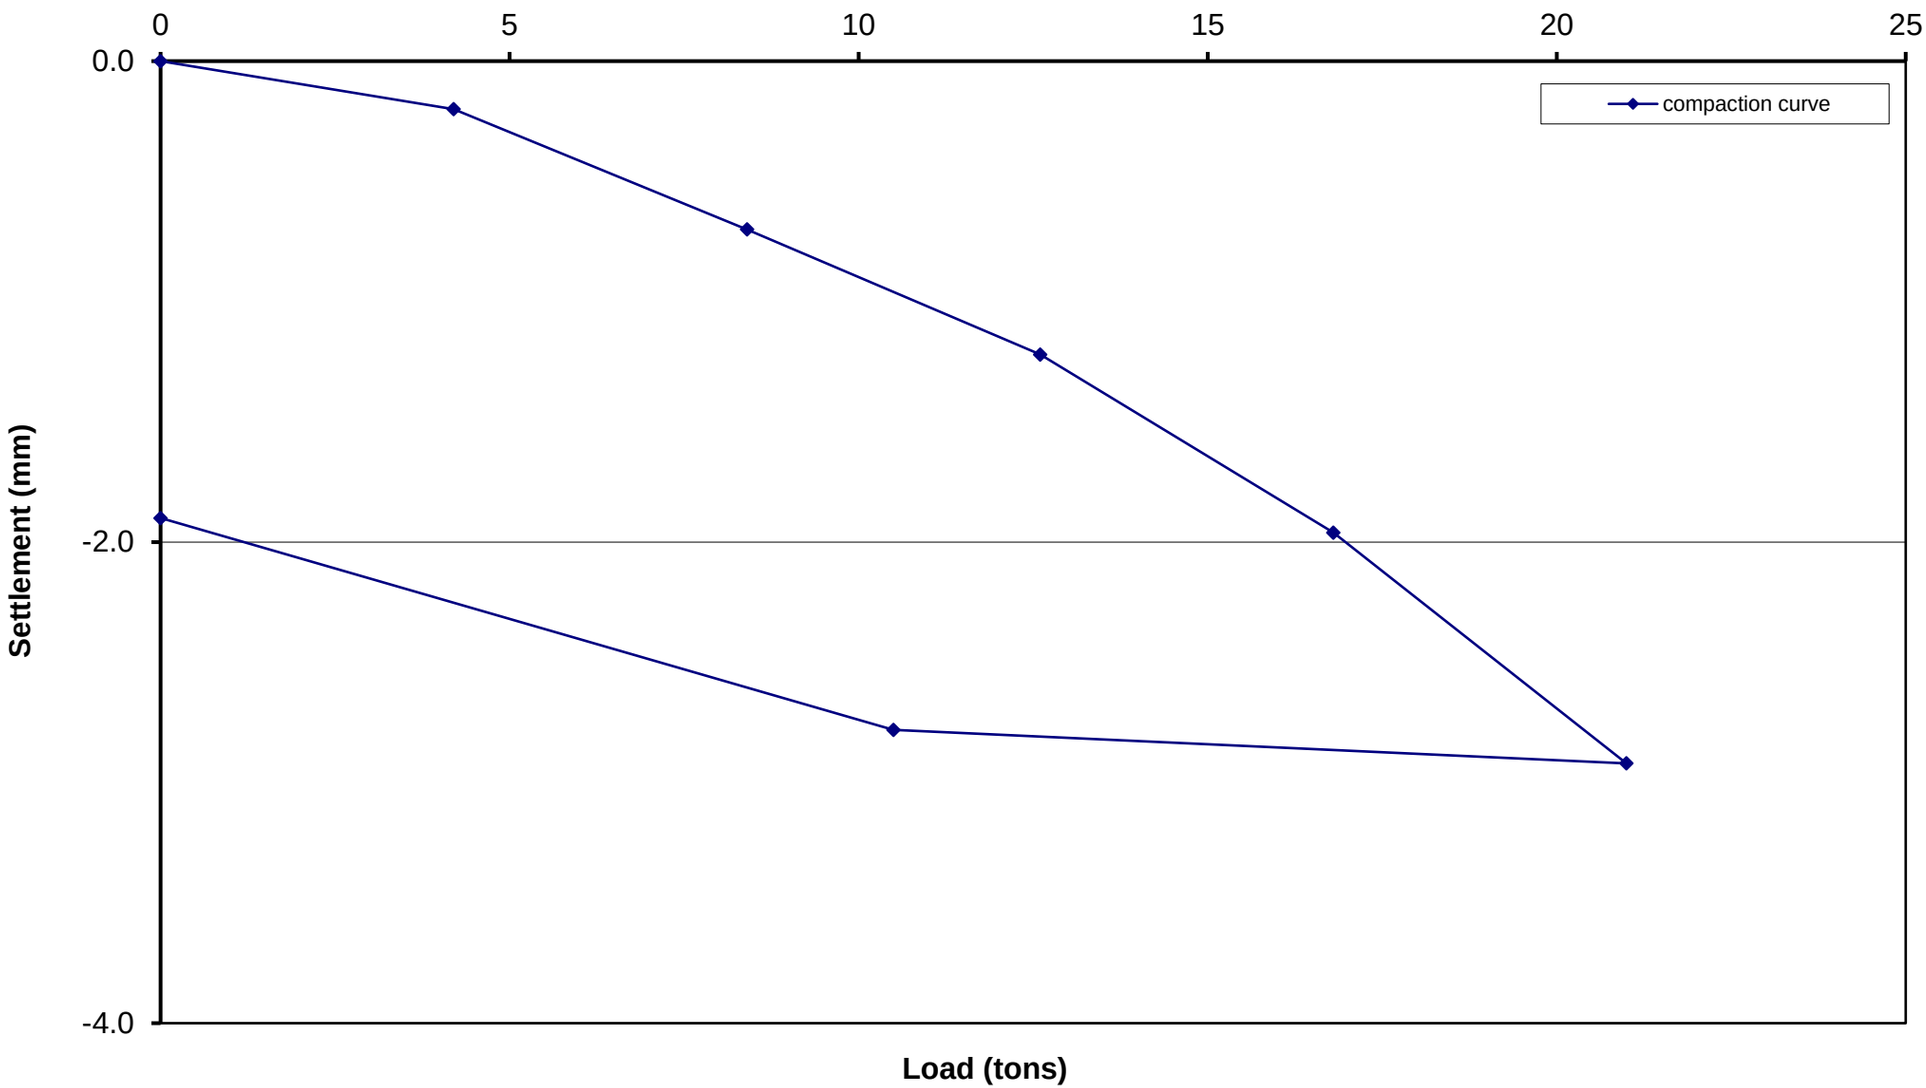

Settlement curve function of the time

